

Ditta Committente: G.C. COSTRUZIONI s.r.l.

Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 999,44 kWp ed opere di rete per la connessione

Località: Comune di Acquaviva Platani (CL) C.da Mistretta snc

PROGETTO DEFINITIVO

N° elaborato

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

FV.04

Cronoprogramma dell'intervento e delle opere di dismissione

Rev. 00

DATA: 08.09.2025

SCALA: N.A.

Formato: A4/A3

Codice di rintracciabilità: 481139094

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	08/09/2025	Prima emissione	Ing. Giacomo Carlisi	Ing. Giacomo Carlisi	Ing. Giacomo Carlisi



C.da Grotticelle / Niscima snc
93100 - Caltanissetta
Tel. 0934 1935052
E-mail: info@energicaweb.com

PROGETTISTA
(ing. Carlisi Giacomo)

COMMITTENTE
G.C. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Ugo Foscolo, snc
93014 - Mussomeli (CL)
C.F. e P.IVA: 01815370851

ENTI

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO per la costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 999,44 kWp per l'ottenimento delle servitù di elettrodotto e per la costruzione delle opere di rete per la connessione da realizzare in Acquaviva Platani (CL) c.da Mistretta snc sui terreni censiti al Foglio 4 Particelle: 265, 266, 267 e 569 (impianto fotovoltaico) e Foglio 4 Particelle: 259, 260, 258, 705, 675, 265 e strada comunale (opere di rete per la connessione) nel Comune di Acquaviva Platani (CL)


ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	GIORNI DI LAVORO
Allestimento cantiere	01/01/2026	06/01/2026	5
Opere di scavo	06/01/2026	13/01/2026	7
Realizzazione strada	13/01/2026	20/01/2026	7
Sistemazione suolo per successivo posizionamento cabine	20/01/2026	27/01/2026	7
Pali gettati in opera	27/01/2026	03/02/2026	7
Realizzazione elettrodotti impianto fotovoltaico	03/02/2026	10/02/2026	7
Posizionamento cabine	10/02/2026	12/02/2026	2
Realizzazione impianto di terra	12/02/2026	16/02/2026	4
Accatastamento Cabine	16/02/2026	11/05/2026	84
Stipula atti servitù volontarie e/o Attività prodromiche per procedura di asservimento coattivo terreni impianto di rete per la connessione ed DPR 327/2001 e s.m.i. compresi la richiesta e l'emissione dei decreti di esproprio ex art. 22 e 23, Decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22-BIS, Decreto di deposito delle somme ex art. 20 ed Immissione in possesso	11/05/2026	05/07/2028	786
Lavori dell'impianto di rete per la connessione	05/07/2028	08/11/2028	126
Montaggio strutture di supporto ai moduli fotovoltaici	08/11/2028	27/11/2028	19
Montaggio moduli fotovoltaici	27/11/2028	20/12/2028	23
Montaggio Inverter	20/12/2028	27/12/2028	7
Collaudi	27/12/2028	31/12/2028	4

1.095 Totale Giorni di lavoro

3,0 Totale Anni di lavoro

	Lavori di realizzazione dell'impianto di Produzione (eseguiti dal Produttore)
	Attività per l'ottenimento di servitù (eseguiti dal Produttore)
	Lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (eseguiti da e-Distribuzione s.p.a.)


CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

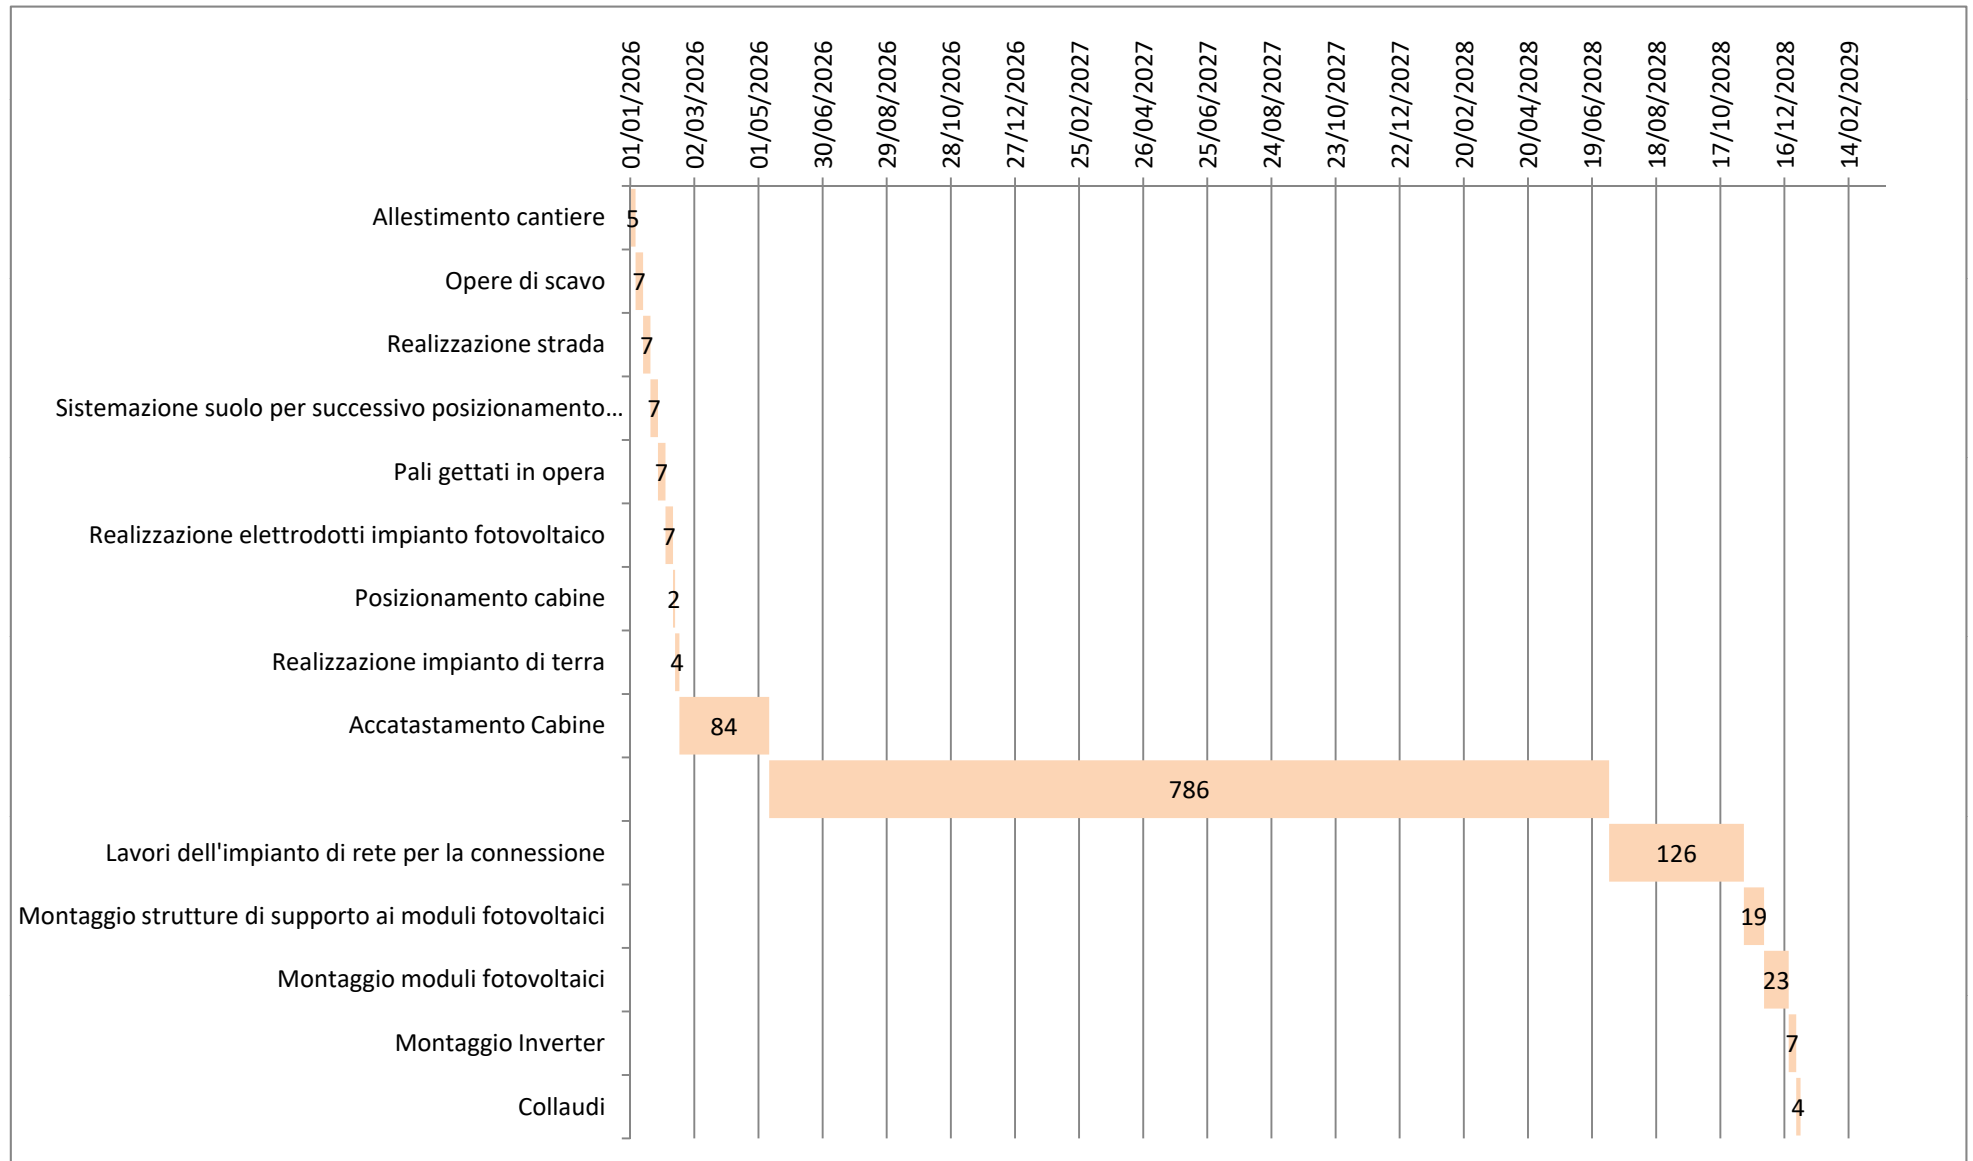

CRONOPROGRAMMA di Esercizio e Dismissione

Costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 999,44 kWp sito a Acquaviva Platani (CL) in c.da Mistretta snc POD: IT001E125889565

	Stimato 30 anni	Mesi			
		1	2	3	4
ATTIVITÀ					
Esercizio impianto					
Smontaggio moduli fotovoltaici					
Rimozione strutture di supporto dei moduli fotovoltaici					
Dismissione linee elettriche e apparecchiature elettroniche					
Trasporto dei materiali a discarica					
Riciclo e smaltimento materiali					



FASE DI ESERCIZIO

FASE DI DISMISSIONE
